LAMPIRAN

LAMPIRAN : DOKUMENTASI

Pekerjaan Tanah



Pekerjaaan Beton



Pemasangan Pagar



Pekerjaan Dinding Dan Kusen



Pekerjaan Beton Lantai 2



Pekerjaaan Dinding Lantai 2



Pekerjaan Atap



Pekerjaan finishing



REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN

NO.	URAIAN PEKERJAAN	HAR.SAT (Rp)	JUMLAH		Bobot (%)
			Rencana Akhir (Kontrak Akhir Hasil CCO)	Realisasi	
1	Pemasangan Papan Nama Kegiatan	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,02
2	Administrasi/Dokumentasi (Kelengkapan FHO)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,05
3	Pekerjaan Bongkaran Atap	14.500,00	2.900.000,00	5.072.970,00	0,28
	Jumlah		**4.250.000,00**	**6.422.970,00**	**0,35**
1	Papan Informasi K3	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,03
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	88.000,00	792.000,00	792.000,00	0,04
2	Sarung Tangan (Safety Gloves)	7.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00
3	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	130.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,06
4	**Rompi Keselamatan (Safety Vest)**	110.000,00	990.000,00	990.000,00	0,05
1	**BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja**	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	0,16
1	Petugas K3	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	0,13
	FASILITAS SARANA KESEHATAN				
1	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban)	388.300,00	388.300,00	388.300,00	0,02
	Jumlah		**9.157.800,00**	**9.157.800,00**	**0,50**
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI I				
1	Galian Tanah	135.000,00	21.787.650,00	21.908.340,00	1,20
2	Urugan tanah kembali dipadatkan	88.500,00	3.570.090,00	3.590.533,50	0,20
3	Urugan pasir	128.200,00	1.305.076,00	1.358.670,01	0,07
4	Pasangan Batu Kosong	581.100,00	11.244.285,00	10.534.180,80	0,58
5	Pasangan Batu Pondasi	1.165.000,00	54.447.731,25	54.447.731,25	2,97
6	Pasangan Batu Bata Saluran	302.500,00	14.157.000,00	14.149.740,00	0,77
7	Pek. Plesteran Saluran (1 : 4)	76.000,00	5.612.600,00	5.628.712,00	0,31

8	Urugan Sirtu bawah Lantai	286.500,00	11.193.555,00	12.262.314,60	0,67
	Jumlah		**123.317.987,25**	**123.880.222,16**	**6,77**
	PEKERJAAN BETON LANTAI I				
1	Pek. Pilecap Dan Kolom Pedestal Beton Bertulang				
	- Beton fc 20 Mpa	1.462.100,00	17.106.570,00	17.092.862,81	0,93
	- Pembesian ≥ 12 mm	25.100,00	54.163.541,00	55.069.449,20	3,01
	- Pembesian < 12 mm	16.300,00	1.753.554,00	1.872.572,69	0,10
	- Bekisting 3x pakai	214.100,00	17.074.475,00	17.074.475,00	0,93
2	**Pek. Sloef Utama (30x40)**				
	- Beton fc 20 Mpa	1.462.100,00	21.492.870,00	22.089.406,80	1,21
	- Pembesian ≥ 12 mm	25.100,00	35.661.327,00	36.170.390,14	1,98
	- Pembesian < 12 mm	16.300,00	6.662.951,00	6.774.623,60	0,37
	- Bekisting 3x pakai	183.100,00	17.930.983,00	18.441.832,00	1,01
3	**Pek. Kolom Utama (35 x 35)**				
	- Beton fc 20 Mpa	1.462.100,00	18.919.574,00	19.010.443,52	1,04
	- Pembesian ≥ 12 mm	25.100,00	57.549.280,00	59.403.278,45	3,24
	- Pembesian < 12 mm	16.300,00	5.740.412,08	5.740.412,08	0,31
	- Bekisting 3x pakai	214.100,00	31.639.698,00	31.814.403,60	1,74
4	Pek. Kolom Praktis (10 x 13)				
	- Beton fc 20 Mpa	1.462.100,00	394.767,00	507.875,06	0,03
	- Pembesian	16.300,00	899.271,00	1.859.368,91	0,10
	- Bekisting 3x pakai	214.100,00	1.190.396,00	1.487.395,52	0,08
5	Pek. Balok Utama (30x50)				
	- Beton fc 20 Mpa	1.462.100,00	24.270.860,00	24.948.572,59	1,36
	- Pembesian ≥ 12 mm	25.100,00	57.446.621,00	63.087.006,66	3,45
	- Pembesian < 12 mm	16.300,00	9.113.330,00	9.380.156,22	0,51

	- Bekisting 3x pakai	239.200,00	36.930.088,00	37.951.663,36	2,07
6	Balok Diafragma (30 x 60)				
	- Beton fc 20 Mpa	1.462.100,00	4.664.099,00	5.558.319,36	0,30
	- Pembesian ≥ 12 mm	25.100,00	11.366.535,00	14.213.628,00	0,78
	- Pembesian < 12 mm	16.300,00	1.693.570,00	1.881.072,16	0,10
	- Bekisting 3x pakai	239.200,00	5.628.376,00	7.956.748,80	0,43
7	Pek. Lantai Plat Beton Bertulang t = 12 cm				
	- Beton fc 20 Mpa	1.462.100,00	41.377.430,00	40.429.685,08	2,21
	- Pembesian	16.300,00	46.226.311,00	46.349.472,89	2,53
	- Bekisting 3x pakai	239.200,00	42.483.737,92	42.483.737,92	2,32
8	Pek. Plat Tangga				
	- Beton fc 20 Mpa	1.462.100,00	3.713.734,00	5.348.032,46	0,29
	- Pembesian < 12 mm	16.300,00	6.144.385,90	6.144.385,90	0,34
	- Bekisting 3x pakai	239.200,00	4.793.568,00	7.688.270,72	0,42
	Jumlah		**584.032.314,89**	**607.829.541,48**	**33,20**
	LANTAI II				
1	Pek. Kolom Utama (25 x 25)				
	- Beton fc 20 Mpa	1.462.100,00	9.474.408,00	19.581.795,64	1,07
	- Pembesian ≥ 12 mm	25.100,00	14.726.672,00	15.336.343,47	0,84
	- Pembesian < 12 mm	16.300,00	5.912.938,12	5.912.938,12	0,32
	- Bekisting 3x pakai	214.100,00	22.227.862,00	32.770.574,20	1,79
2	Pek. Ringbalk (10 x18)				
	- Beton fc 20 Mpa	1.462.100,00	4.093.880,00	4.084.961,19	0,22
	- Pembesian < 12 mm	16.300,00	8.119.087,12	8.119.087,12	0,44
	- Bekisting 3x pakai	214.100,00	11.976.754,00	11.996.879,40	0,66
3	Pek. Plat Koridor				
	- Beton fc 20 Mpa	1.462.100,00	409.388,00	683.894,35	0,04

	- Pembesian < 12 mm	16.300,00	784.031,40	784.031,40	0,04
	- Bekisting 3x pakai	239.200,00	406.640,00	669.736,08	0,04
4	Pek. Balok Koridor (30x50)				
	- Beton fc 20 Mpa	1.462.100,00	336.283,00	610.046,60	0,03
	- Pembesian ≥ 12 mm	25.100,00	788.642,00	1.542.613,87	0,08
	- Pembesian < 12 mm	16.300,00	250.205,00	229.365,12	0,01
	- Bekisting 3x pakai	239.200,00	891.266,94	928.000,32	0,05
	Jumlah		**80.398.057,58**	**103.250.266,89**	**5,64**
PEMASANGAN PAGAR					
1	**Galian Tanah**	135.000,00	1.080.000,00	862.312,50	0,05
2	Urugan tanah kembali dipadatkan	88.500,00	177.000,00	141.323,44	0,01
3	Pasangan Batu Pondasi	1.165.000,00	6.698.750,00	5.049.546,88	0,28
4	Pek. Sloef (20x20)				
	- Beton fc 20 Mpa	1.462.100,00	1.111.196,00	1.013.966,35	0,06
	- Pembesian < 12 mm	16.300,00	1.013.697,00	1.024.741,88	0,06
	- Bekisting 3x pakai	183.100,00	1.391.560,00	1.336.630,00	0,07
5	Pek. Kolom (20x20)				
	- Beton fc 20 Mpa	1.462.100,00	804.155,00	179.428,91	0,01
	- Pembesian ≥ 12 mm	25.100,00	1.229.398,00	910.407,12	0,05
	- Pembesian < 12 mm	16.300,00	149.634,00	72.873,78	0,00
	- Bekisting 3x pakai	214.100,00	2.363.664,00	1.050.974,08	0,06
6	Pek. Ringbalk (20 x15)				
	- Beton fc 20 Mpa	1.462.100,00	833.397,00	387.090,98	0,02
	- Pembesian < 12 mm	16.300,00	939.043,00	863.315,16	0,05
	- Bekisting 3x pakai	214.100,00	1.220.370,00	1.133.659,50	0,06
7	Pek. Ringbalk (13x15)				
	- Beton fc 20 Mpa	1.462.100,00	540.977,00	387.090,98	0,02

	- Pembesian < 12 mm	16.300,00	918.505,00	863.315,16	0,05
	- Bekisting 3x pakai	214.100,00	1.220.370,00	1.133.659,50	0,06
	Jumlah		**21.691.716,00**	**16.410.336,20**	**0,90**
	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
	PEKERJAAN DINDING & LANTAI				
	LANTAI I				
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	147.000,00	34.164.270,00	36.879.183,60	2,01
2	Pek. Plesteran Dinding (1 : 4)	76.000,00	34.004.680,00	38.133.577,60	2,08
3	Pek. Cat Dinding Tembok	44.500,00	18.471.505,00	18.366.244,70	1,00
4	Acian Dinding	62.450,00	25.922.370,50	29.316.203,26	1,60
5	Pek. Acian Beton	62.450,00	11.096.840,42	11.096.840,42	0,61
6	Pasangan Lantai Keramik 40 x 40	157.200,00	34.449.876,96	36.210.123,96	1,98
7	Pasangan Lantai Keramik 20 x 20 (WC)	242.700,00	1.577.550,00	1.518.525,36	0,08
8	Pasangan Dinding Keramik 20 x 25 (WC)	307.700,00	9.951.018,00	9.945.725,56	0,54
9	Pasangan Dinding Keramik 20 x 20				
10	Pasangan Keramik 30 x 30 Tangga	343.200,00	4.509.648,00	7.042.772,88	0,38
11	Pekerjaan Rabat Beton Lantai fc 7,5 Mpa	1.259.100,00	23.573.978,21	23.573.978,21	1,29
	Jumlah		**197.721.737,09**	**212.083.175,55**	**11,58**
	PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA				
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Kayu Kls II	121.500,00	24.946.380,00	25.562.385,00	1,40
2	Pek. Jalusi Kusen Pintu & Jendela Kayu Kls II	821.600,00	13.014.144,00	13.014.144,00	0,71
3	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls II	987.100,00	9.377.450,00	9.405.088,80	0,51
4	Pas. Daun Jendela Kaca (Ungkit)	281.500,00	3.135.910,00	3.245.920,20	0,18
5	Pas. Kaca Jendela / Kaca Mati Tebal 5 mm	282.400,00	4.953.296,00	5.492.651,76	0,30
6	Pek. Cat Kayu (Kusen pintu dan jendela)	78.500,00	8.514.110,00	9.607.850,50	0,52
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	186.100,00	1.302.700,00	1.302.700,00	0,07
8	Pek. Engsel Pintu	66.500,00	1.396.500,00	1.396.500,00	0,08

9	Pek. Pas. Grendel Pintu	74.000,00	518.000,00	518.000,00	0,03
10	Pek. Engsel Jendela	46.000,00	2.208.000,00	2.208.000,00	0,12
11	Pek. Pas. Grendel Jendela	59.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	0,08
12	Pek. Pas. Hak Angin	54.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00	0,14
13	Pek. Handel Pintu		-	-	0,00
	Jumlah		**73.374.490,00**	**75.761.240,26**	**4,14**
	PEKERJAAN PASANGAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow Metal Furing	162.100,00	33.254.815,00	32.615.995,11	1,78
2	Pek. Plafond Klasiboard	73.100,00	14.996.465,00	14.708.385,21	0,80
3	Pas. List Plafon kayu sudut Profil	16.500,00	2.224.860,00	2.588.520,00	0,14
4	Pek. Cat Plafond	44.450,00	9.118.917,50	10.059.995,12	0,55
5	Pek. Cat Lis Plafpond	78.500,00	529.090,00	492.603,20	0,03
	Jumlah		**60.124.147,50**	**60.465.498,64**	**3,30**
	PEMASANGAN PAGAR				
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	147.000,00	4.837.770,00	4.825.863,00	0,26
2	Pek. Plesteran Dinding (1 : 4)	76.000,00	5.002.320,00	6.546.640,00	0,36
3	Pek. Cat Dinding Tembok	44.500,00	2.928.990,00	3.833.230,00	0,21
	Jumlah		**12.769.080,00**	**15.205.733,00**	**0,83**
LANTAI II PEKERJAAN DINDING & LANTAI					
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	147.000,00	35.127.120,00	40.563.841,50	2,22
2	Pek. Plesteran Dinding (1 : 4)	76.000,00	36.321.920,00	41.943.564,00	2,29
3	Acian Dinding	62.450,00	29.845.479,50	34.465.468,05	1,88
4	Pek. Acian Beton	62.450,00	9.024.849,34	9.024.849,34	0,49
5	Pek. Cat Dinding Tembok	44.500,00	21.267.885,00	24.559.060,50	1,34
6	Pasangan Lantai Keramik 40 x 40	157.200,00	33.565.564,08	33.565.564,08	1,83
	Jumlah		**165.152.817,92**	**184.122.347,47**	**10,06**

PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA					
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Kayu Kls II	121.500,00	22.817.700,00	23.462.865,00	1,28
2	Pek. Jalusi Kusen Pintu & Jendela Kayu Kls II	821.600,00	13.515.320,00	13.014.144,00	0,71
3	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls II	987.100,00	5.211.888,00	4.998.674,40	0,27
4	Pas. Daun Jendela Kaca (Ungkit)	281.500,00	3.133.095,00	3.245.920,20	0,18
5	Pas. Kaca Jendela / Kaca Mati Tebal 5 mm	282.400,00	5.407.960,00	5.492.651,76	0,30
6	Pek. Cat Kayu (Kusen pintu dan jendela)	78.500,00	6.956.670,00	8.625.093,30	0,47
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	186.100,00	558.300,00	558.300,00	0,03
8	Pek. Engsel Pintu	66.500,00	598.500,00	598.500,00	0,03
9	Pek. Pas. Grendel Pintu	74.000,00	222.000,00	222.000,00	0,01
10	Pek. Engsel Jendela	46.000,00	2.208.000,00	2.208.000,00	0,12
11	Pek. Pas. Grendel Jendela	59.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	0,08
12	Pek. Pas. Hak Angin	54.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00	0,14
13	Pek. Handel Pintu		-		
	Jumlah		**64.637.433,00**	**66.434.148,66**	**3,63**
PEKERJAAN PASANGAN PLAFOND					
1	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow Metal Furing	162.100,00	47.278.491,25	47.278.491,25	2,58
2	Pek. Plafond Klasiboard	73.100,00	21.320.528,75	21.320.528,75	1,16
3	Pas. List Plafon kayu sudut Profil	16.500,00	2.263.470,00	4.682.700,00	0,26
4	Pek. Cat Plafond	44.450,00	12.964.398,13	12.964.398,13	0,71
5	Pek. Cat Lis Plafpond	78.500,00	538.510,00	891.132,00	0,05
	Jumlah		**84.365.398,13**	**87.137.250,13**	**4,76**
	PEKERJAAN PASANGAN ATAP				
1	Pek. Kuda-kuda Baja Ringan Main Truss C75	382.100,00	135.370.388,00	135.890.044,00	7,42
2	Pas. Atap Spandek 0,4 mm (warna)	143.500,00	51.750.405,00	51.784.845,00	2,83
3	Pasangan Nok Spandek	282.500,00	13.579.775,00	11.836.750,00	0,65


4	Pasangan Listplank 30 Cm Kalsiboard	92.000,00	6.925.760,00	6.955.200,00	0,38
5	Pek. Cat Lisplank	78.500,00	2.044.140,00	1.780.380,00	0,10
	Jumlah		**209.670.468,00**	**208.247.219,00**	**11,37**
	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING				
	LANTAI I				
	PEKERJAAN MEKANIKAL, DAN ELEKTRIKAL				
1	Instalasi titik nyala NYM 2x1,5mm	383.100,00	6.895.800,00	6.895.800,00	0,38
2	Instalasi titik Stop Kontak NYM 2x1,5mm	513.500,00	1.540.500,00	1.540.500,00	0,08
3	Pasangan Saklar Ganda	37.100,00	148.400,00	148.400,00	0,01
4	Pasangan Saklar Tunggal	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5	Pasangan Stop Kontak 13A	27.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00
6	Fitting Tempel Bohlam LED 14 Watt	186.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	0,18
7	Pemasangan 1 Unit MCB Box	152.100,00	152.100,00	152.100,00	0,01
	Jumlah		**12.227.300,00**	**12.227.300,00**	**0,67**
	PEKERJAAN PLAMBING				
1	Kloset Jongkok	832.300,00	3.329.200,00	3.329.200,00	0,18
2	Pasangan Kran 3/4 "	126.100,00	504.400,00	504.400,00	0,03
3	Pipa PVC 3/4" Type AW	38.000,00	760.000,00	760.000,00	0,04
4	Pipa PVC 3" Type AW	175.500,00	3.510.000,00	3.510.000,00	0,19
5	Memasang 1 bh Floor Drain	134.500,00	538.000,00	538.000,00	0,03
6	Pembuatan Septictank 1.5 x 2 x 2 m + Peresapan	8.068.000,00	8.068.000,00	8.068.000,00	0,44
	Jumlah		**16.709.600,00**	**16.709.600,00**	**0,91**
LANTAI II **PEKERJAAN MEKANIKAL, DAN ELEKTRIKAL**					
1	Instalasi titik nyala NYM 2x1,5mm	383.100,00	6.512.700,00	6.512.700,00	0,36

2	Instalasi titik Stop Kontak NYM 2x1,5mm	513.500,00	2.567.500,00	2.567.500,00	0,14
3	Pasangan Saklar Ganda	37.100,00	148.400,00	148.400,00	0,01
4	Pasangan Saklar Tunggal	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5	Pasangan Stop Kontak 13A	27.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00
6	Fitting Tempel Bohlam LED 14 Watt	186.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	0,18
7	Pemasangan 1 Unit MCB Box	152.100,00	152.100,00	152.100,00	0,01
	Jumlah		**12.871.200,00**	**12.871.200,00**	**0,70**
PEKERJAAN TAMBAHAN **LANTAI I**					
1	Pek. Pengecatan Beton	44.500,00	7.442.509,30	**7.442.509,30**	0,41
LANTAI II					
2	Pek. Pengecatan Beton	44.500,00	6.430.837,40	**6.430.837,40**	0,35
	Jumlah		**13.873.346,70**	**13.873.346,70**	**0,76**
		Realcoast	**1.746.344.894,06**	**1.832.089.196,13**	**100,06**
		Pembulatan	**1.746.344.000,00**	**1.832.089.000,00**	

TIME SCHEDULE PROJEK AWAL


PEKERJAAN : Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 16 Pinrang
KEGIATAN :
LOKASI PEKERJAAN : KEC. WATANG SAWITTO KAB.PINRANG
PENYEDIA KONSTRUKSI : CV. RAHMAT PRATAMA
Kontrak No : 034/SP/DAU/DIKBUD/IV/2024, Tanggal, 22 April 2024
SATKER/SKPD : DINAS PEDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. PINRANG
Alamat : Jl. Jend.GATOT SUBROTONo. 03 Kabupaten Pinrang

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME Bobot	MINGGU 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	KET
																													100
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,24																											
2	PENYELENGGARAAN SMK 3	0,52																											
	LANTAI I																												
	PEKERJAAN STRUKTUR																												
4	PEKERJAAN TANAH DLL	7,27																											
5	PEKERJAAN BETON	33,73																											
6	PEMASANGAN PAGAR	1,24																											
7	PEKERJAAN DINDING & LANTAI	11,30																											
8	PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA	4,20																											
9	PEKERJAAN PASANGAN PLAFOND	3,44																											
10	PEMASANGAN PAGAR	0,73																											
	LANTAI II																												50
11	PEKERJAAN BETON	4,84																											
12	PEKERJAAN DINDING & LANTAI	9,29																											
13	PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA	3,70																											
14	PEKERJAAN PASANGAN PLAFOND	5,08																											
15	PEKERJAAN PASANGAN ATAP	12,01																											
16	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING																												
	LANTAI I																												
17	PEKERJAAN MEKANIKAL, DAN ELEKTRIKAL	0,70																											
18	PEKERJAAN PLAMBING	0,96																											
	LANTAI II																												
19	PEKERJAAN MEKANIKAL, DAN ELEKTRIKAL	0,74																											0
	Rencana	**100,00**	1,05	0,95	0,70	0,50	0,80	1,00	1,30	3,40	2,80	4,30	4,90	4,50	5,00	6,30	5,50	7,05	14,95	6,80	5,70	4,00	3,00	3,00	3,50	2,50	2,50	4,00	
	Komulatif Rencana		1,05	2,00	2,70	3,20	4,00	5,00	6,30	9,70	12,50	16,80	21,70	26,20	31,20	37,50	43,00	50,05	65,00	71,80	77,50	81,50	84,50	87,50	91,00	93,50	96,00	100,00	
	Realisasi		-	-	0,86	1,74	7,69	8,02	4,77	6,09	0,86	4,89	5,13	12,17	0,70	3,36	3,36	1,39	3,88	6,22	5,74	8,70	3,97	2,48	1,91	5,65	0,41	Pekerjaan Selesai	
	Komulatif Realisasi		-	-	0,86	2,60	10,29	18,30	23,07	29,17	30,03	34,91	40,04	52,21	52,92	56,28	59,64	61,03	64,91	71,13	76,88	85,57	89,54	92,02	93,93	99,59	100,0		
	Deviasi +/-		-1.05	-2.00	-1.84	-0.60	+6.29	+13.3	+16.77	+19.47	+17.53	+18.11	+18.34	+26.01	+21.72	+18.78	+16.64	+10.98	-0.09	-0.62	+0.62	+4.07	+5.04	+4.52	+2.93	+06.09	+04.00		
			Terlambat	Terlambat	Terlambat	Terlambat	Cepat	Cepat	Cepat	Cepat	Cepat	Cepat	Cepat	Cepat	Cepat	Cepat	Cepat	Cepat	Terlambat	Terlambat	Cepat	Cepat	Cepat	Cepat	Cepat	Cepat	Cepat		

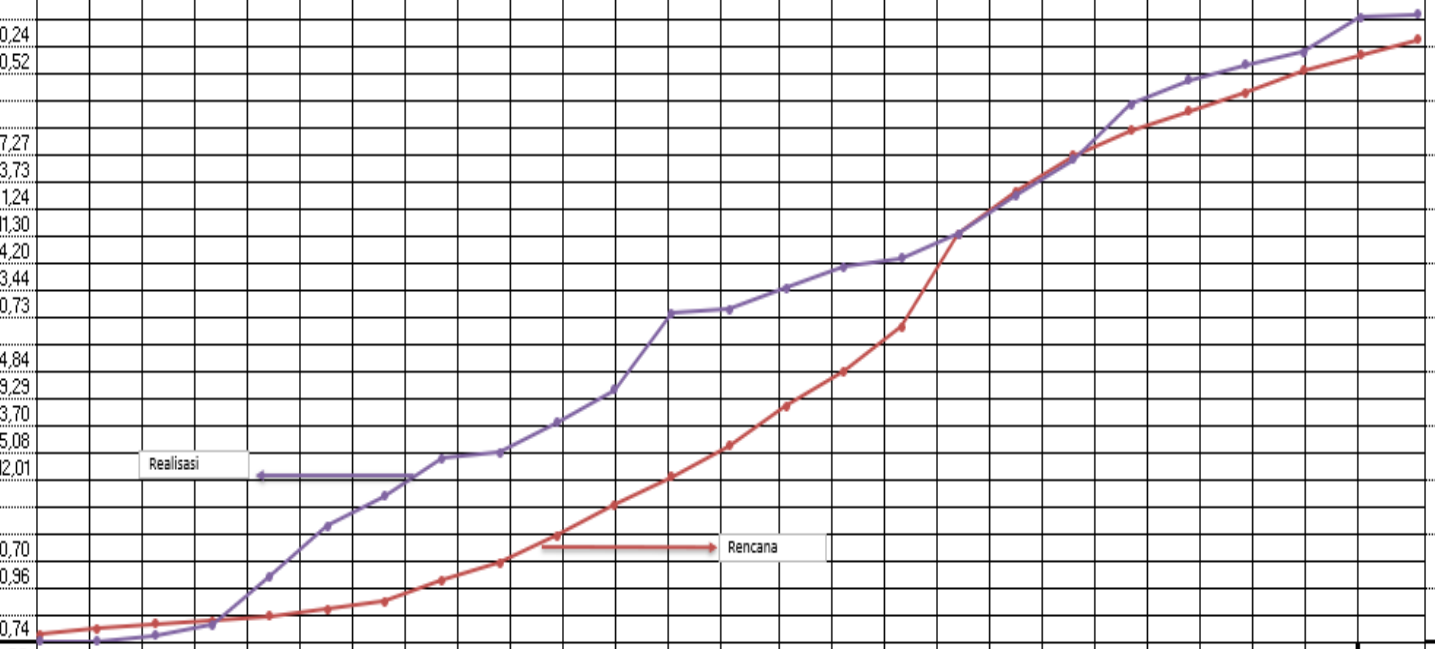


TIME SCHEDULE METODE CPM


No	Kode	Uraian	Bobot(%)	Durasi	Earliest		Latest		Slack Time	Ket
					ES	EF	LS	LF		
1	A	Perkerjaan Persiapan	0,24	1	0	1	0	1	0	Kritis
2	B	Penyelenggaraan SDN	0,52	1	1	2	1	2	0	Kritis
3	C	Perkerjaan Tanah	7,27	1	2	3	2	3	0	Kritis
4	D	Pekerjaan Beton Lantai 1	16,87	2	3	6	3	6	0	Kritis
5	E	Pemasangan Pagar	1,24	1	8	9	12	13	4	Non Kritis
6	F	Pekerjaan dinding & Lantai	11,30	2	6	8	6	8	0	Kritis
7	G	Pekerjaan Kusen,Pintu Jendela	4,20	2	8	10	10	12	2	Non Kritis
8	H	Pekerjaan Plafon	3,44	2	10	12	12	14	2	Non Kritis
9	I	Pekerjaan Beton Lantai II	14,84	3	8	11	8	11	0	Kritis
10	J	Pekerjaan dinding & Lantai II	9,29	2	11	13	11	13	0	Kritis
11	k	Pekerjaan Kusen,Pintu Jendela Lantai II	3,76	2	13	15	13	15	0	Kritis
12	L	Pekerjaan Plafon Lantai II	5,08	2	13	15	15	17	2	Non Kritis
13	M	Perkerjaan Atap	12,01	2	15	17	15	17	0	Kritis
14	N	Pekerjaan Mekanikal,Elektrikal,plimbing Lantai I	0,75	1	12	13	14	15	2	Non Kritis
15	O	Pekerjaan Mekanikal,Elektrikal,plimbing Lantai II	0,76	1	17	18	17	18	0	Kritis

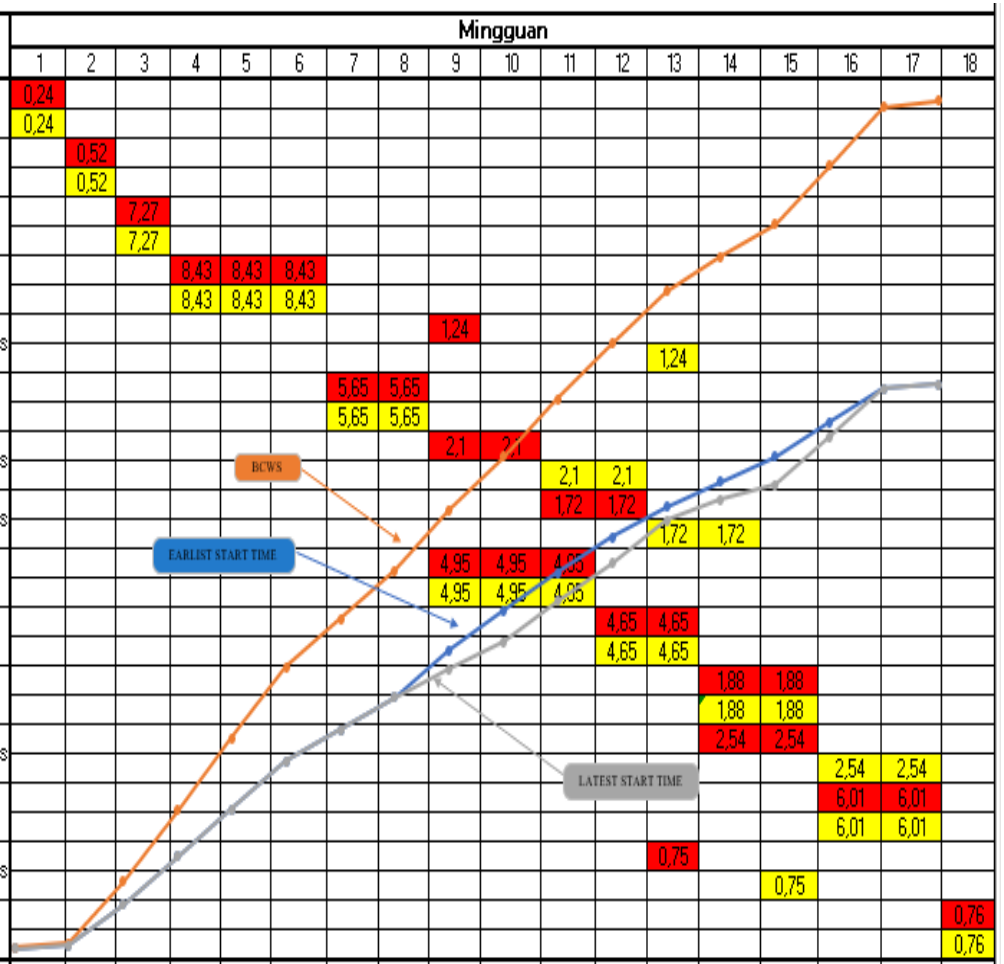


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
EARLIST	Progres Rencana (%)	0,24	0,52	7,27	8,43	8,43	8,43	5,65	5,65	8,29	7,05	6,67	6,37	5,40	4,42	4,42	6,01	6,01	0,76
	Total Kumulatif Rencana (%)	0,24	0,76	8,03	16,46	24,90	33,33	38,98	44,63	52,91	59,96	66,63	72,99	78,39	82,81	87,23	93,23	99,24	100,00
BCWS	Progres Rencana (%)	0,36	0,78	10,91	12,65	12,65	12,65	8,48	8,48	10,76	9,52	10,19	9,74	9,20	6,22	5,74	10,28	10,28	1,14
	Total Kumulatif Rencana (%)	0,36	1,14	12,05	24,69	37,34	49,99	58,47	66,94	77,70	87,22	97,41	107,15	116,35	122,57	128,30	138,58	148,86	150,00
LATEST	Progres Rencana (%)	0,24	0,52	7,27	8,43	8,43	8,43	5,65	5,65	4,95	4,95	7,05	6,75	7,61	3,60	2,63	8,55	8,55	0,76
	Total Kumulatif Rencana (%)	0,24	0,76	8,03	16,46	24,90	33,33	38,98	44,63	49,57	54,52	61,57	68,31	75,92	79,52	82,15	90,69	99,24	100,00

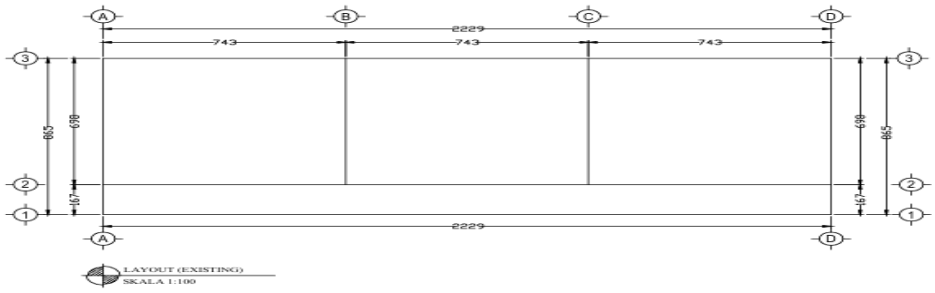


LAYOUT (EXISTING)
SKALA 1:100

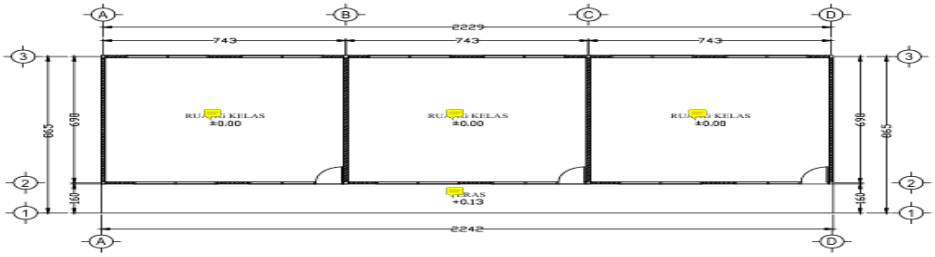


DENAH (EXISTING)
SKALA 1:100




TAMPAK DEPAN (EXISTING)
SKALA 1:100




TAMPAK SAMPING KANAN (EXISTING)
SKALA 1:100





TAMPAK BELAKANG (EXISTING)
SKALA 1:100





TAMPAK SAMPING KIRI (EXISTING)
SKALA 1:100

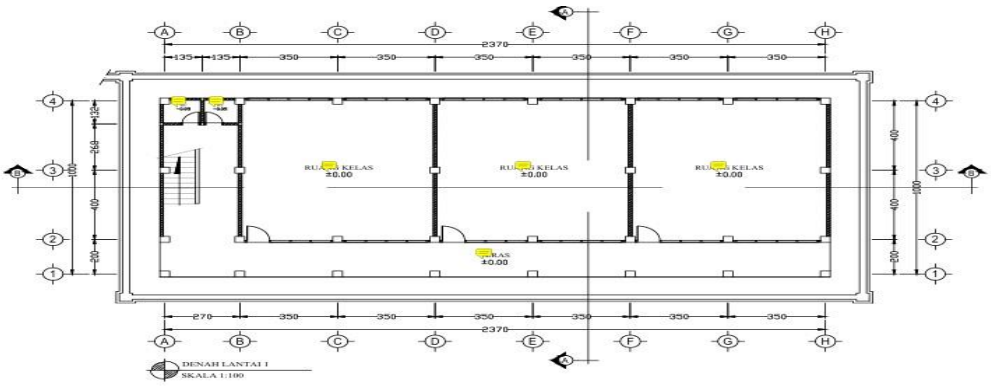

RUANG KELAS
±0.00
TERAS
±0.00
2370
DENAH LANTAI 1
SKALA 1:100

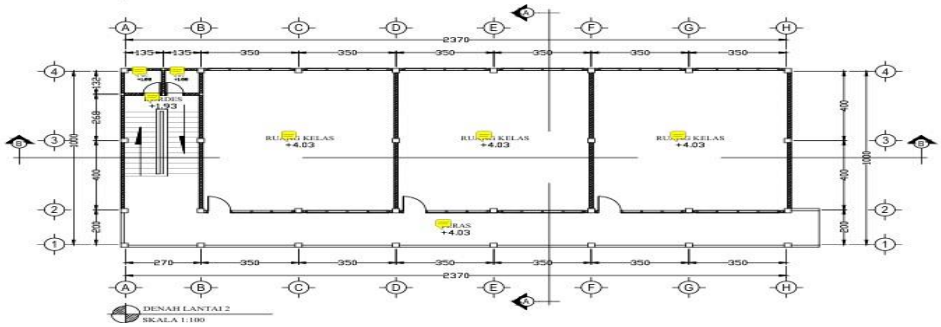

RUANG KELAS
+4.03
TERAS
+4.03
2370
DENAH LANTAI 2
SKALA 1:100

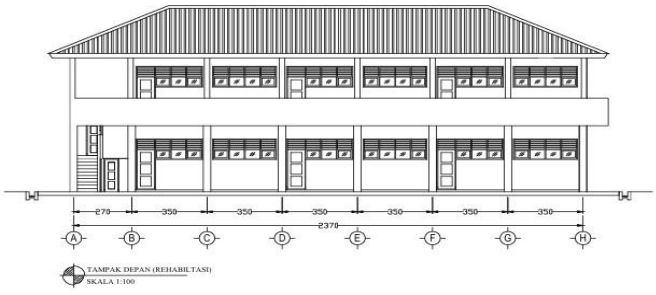
2370
TAMPAK DEPAN (REHABILTASI)
SKALA 1:100

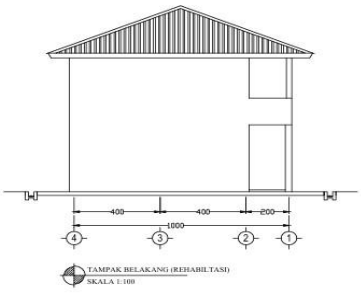

1000
TAMPAK BELAKANG (REHABILTASI)
SKALA 1:100

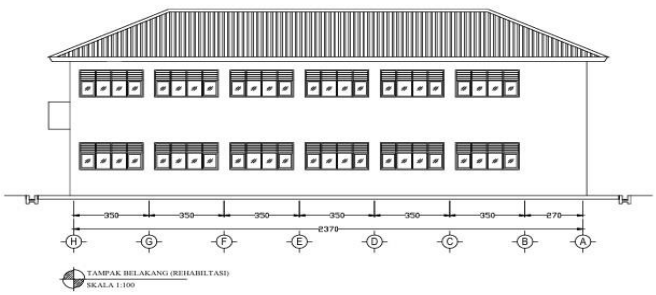
2370
TAMPAK BELAKANG (REHABILTASI)
SKALA 1:100

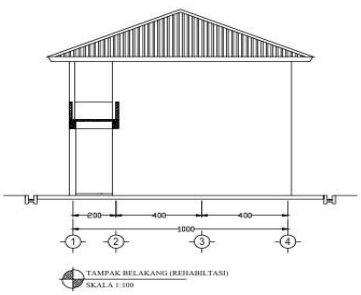

1000
TAMPAK BELAKANG (REHABILTASI)
SKALA 1:100

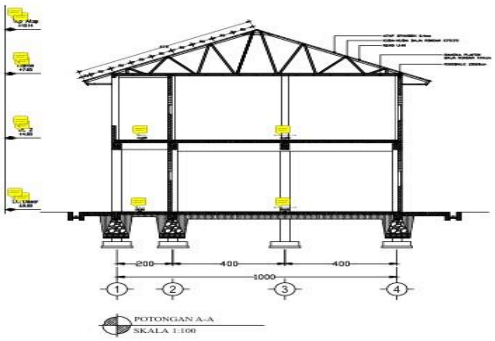


POTONGAN A-A
SKALA 1:100

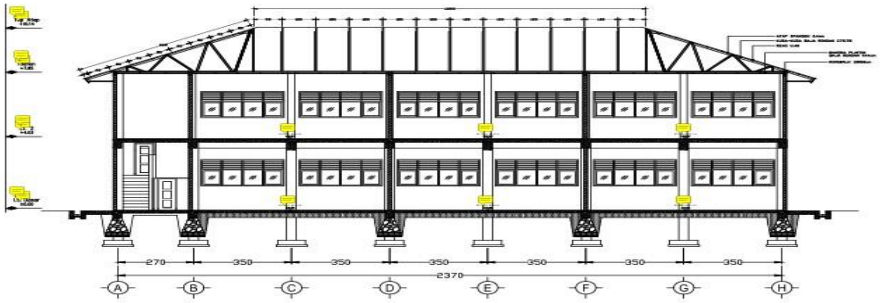


TAMPAK BELAKANG
SKALA 1:100




DETAIL PONDASI BANTU GUNUNG (A-A)
SKALA 1:30




DETAIL PONDASI BANTU GUNUNG (B-B)
SKALA 1:30

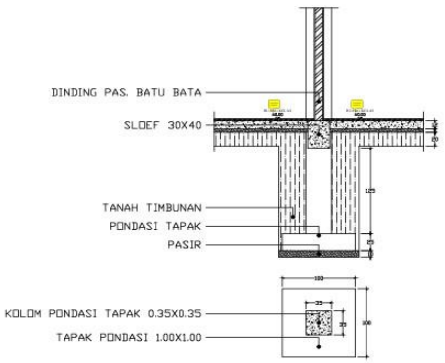


DETAIL PONDASI TAPAK (PT1)
SKALA 1:30

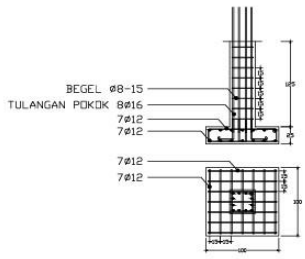


TULANGAN PONDASI TAPAK
SKALA 1:30

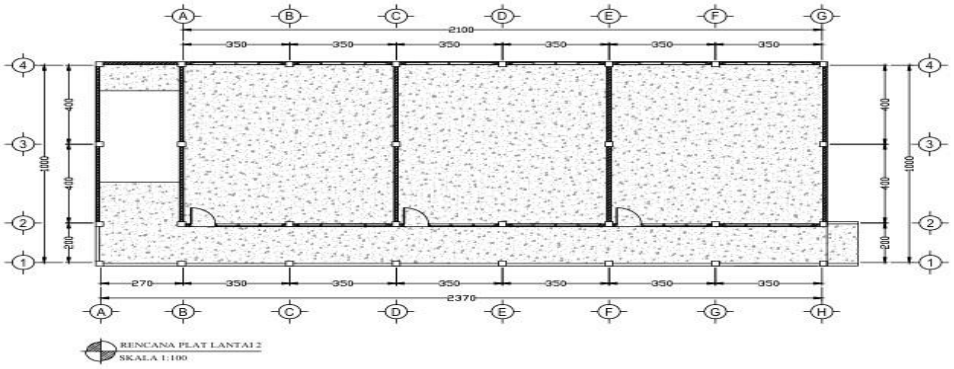


RENCANA PLAT LANTAI 2
SKALA 1:100

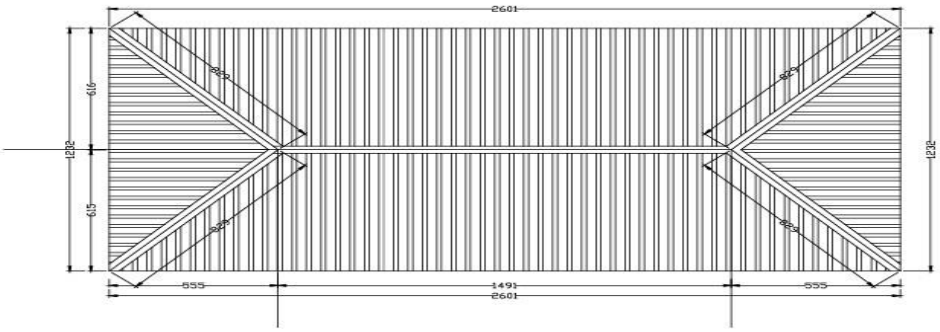

RENCANA ATAP
SKALA 1:80

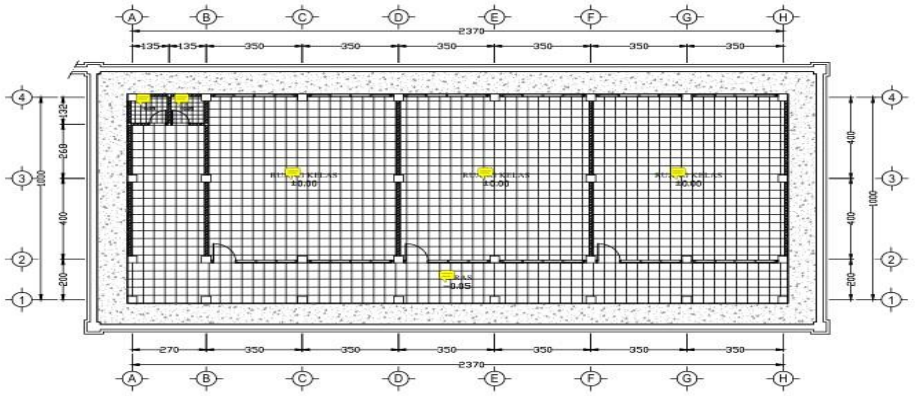

DENAH RENCANA LANTAI 1
SKALA 1:100

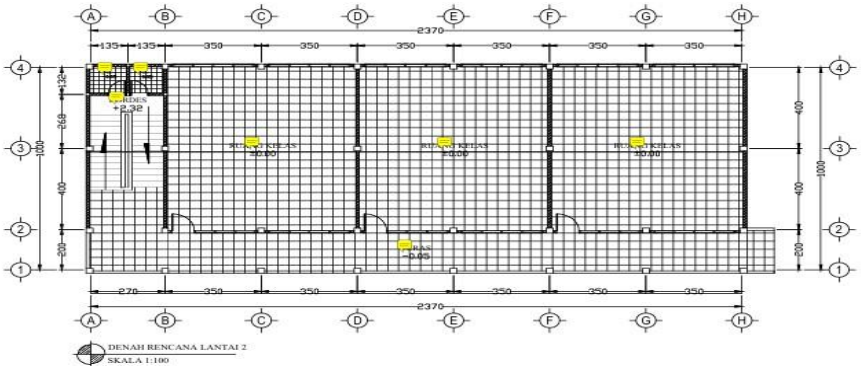

DENAH RENCANA LANTAI 2
SKALA 1:100

BIODATA PENULIS

Muh.Nawir T Lahir di Pinrang, 12 januari 2000. Anak pertama dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Tahir Caco dan Ibu Mariani Abdullah. Pendidikan yang di tempuh penulis yaitu SDN 162 Pinrang dan Lulus tahun 2012, SMPN 2 Pinrang masuk pada tahun 2012 dan lulus tahun 2015, melanjutkan jenjang di SMAN 1 Pinrang dan lulus tahun 2018. Hinggah kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Universitas Muhammadiyah parepare dan memilih program studi Teknik Sipil, penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan Dan Pengabdian Masyarakat di Dinas PUPR Pinrang pada Tahun 2021 dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul "Analisis Network Planning Dengan Cpm (Critical Path Method) Dalam Rangka Efisiensi Waktu Dan Biaya Pada Pembangunan Gedung Bertingkat (Studi Kasus SDN 16 Kab.Pinrang)"
